*5. Proposta di intervento*

*Il dettaglio della proposta generale di intervento, anche dal punto di vista delle fasi di lavoro, è il seguente:*

*5.1 Fase 1: p.lla 640*

*Dettaglio fronte sulla via – crollo della 640*

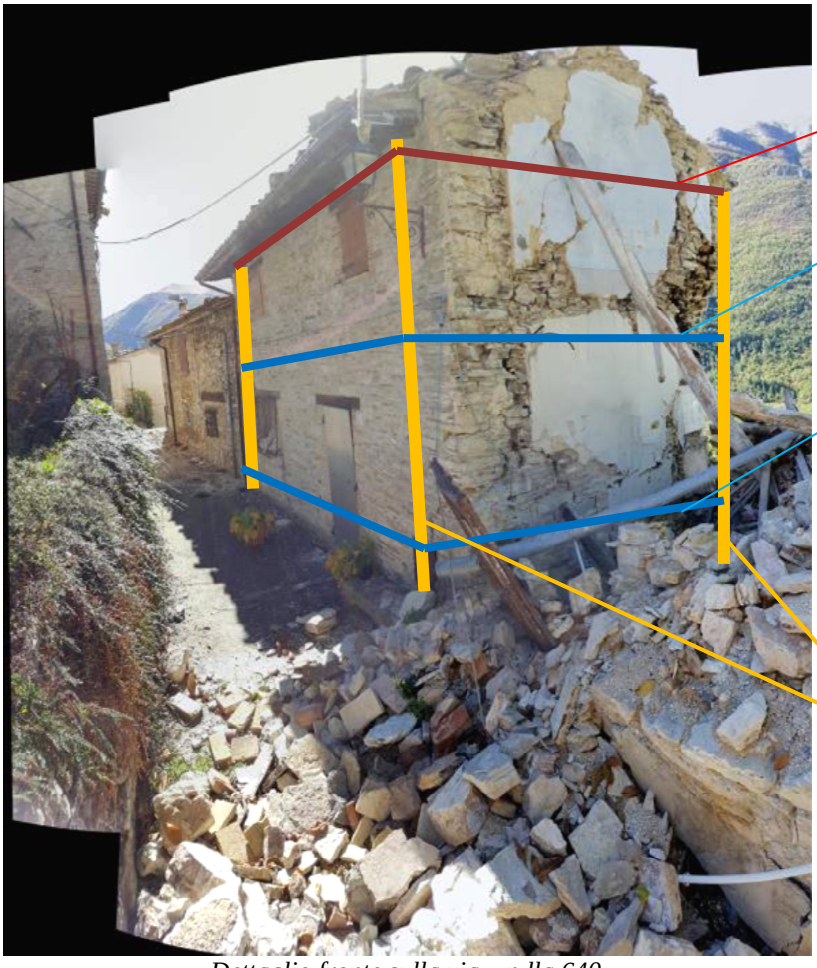


*Dettaglio fronte sulla via – p.lla 640*



STUDIO EMME ERRE INGEGNERIA
Via Dante Romagnoli 30 - 62100 Macerata - tel: 0733.969317
P.I:01358610432-C.F:RGHMRC71B01E783D-e.mail:marcorughini@libero.it

*5.2 Fase 2: p.lla 647/648/652/1293*

*Dettaalio fronte sulla via – 640 a destra. 647 a sinistra*

***PORTALE CONTINUO*** *realizzato con elementi a telaio metallico (da ponteggio) e tavola metallica in testa rinforzata con secondo strato in legno e interposto strato di pvc, posto in opera al centro del vialetto e contrastato con canne tipo innocenti ai fabbricati. Tale realizzazione dovrà lasciare spazio libero tra il telaio stesso e le facciate dei fabbricati, al fine di consentire una eventuale ulteriore messa in sicurezza delle facciate se necessario e comunque di poter prendere misure, fare valutazioni senza interrompere la continuità visiva su tutte le facciate.*
***PRIMA della posa del tunnel andranno bonificati tutti i cornicioni***



MARCO RUGHINI
i n g e g n e r e

STUDIO EMME ERRE INGEGNERIA
Via Dante Romagnoli 30 - 62100 Macerata - tel: 0733.969317
P.I:01358610432-C.F:RGHMRC71B01E783D-e.mail:marcorughini@libero.it

*Dettaglio danno tra la 647 e 648*



MARCO RUGHINI
i n g e g n e r e

STUDIO EMME ERRE INGEGNERIA
Via Dante Romagnoli 30 - 62100 Macerata - tel: 0733.969317
P.I:01358610432-C.F:RGHMRC71B01E783D-e.mail:marcorughini@libero.it

*5.3 Fase 3: p.lla 646*

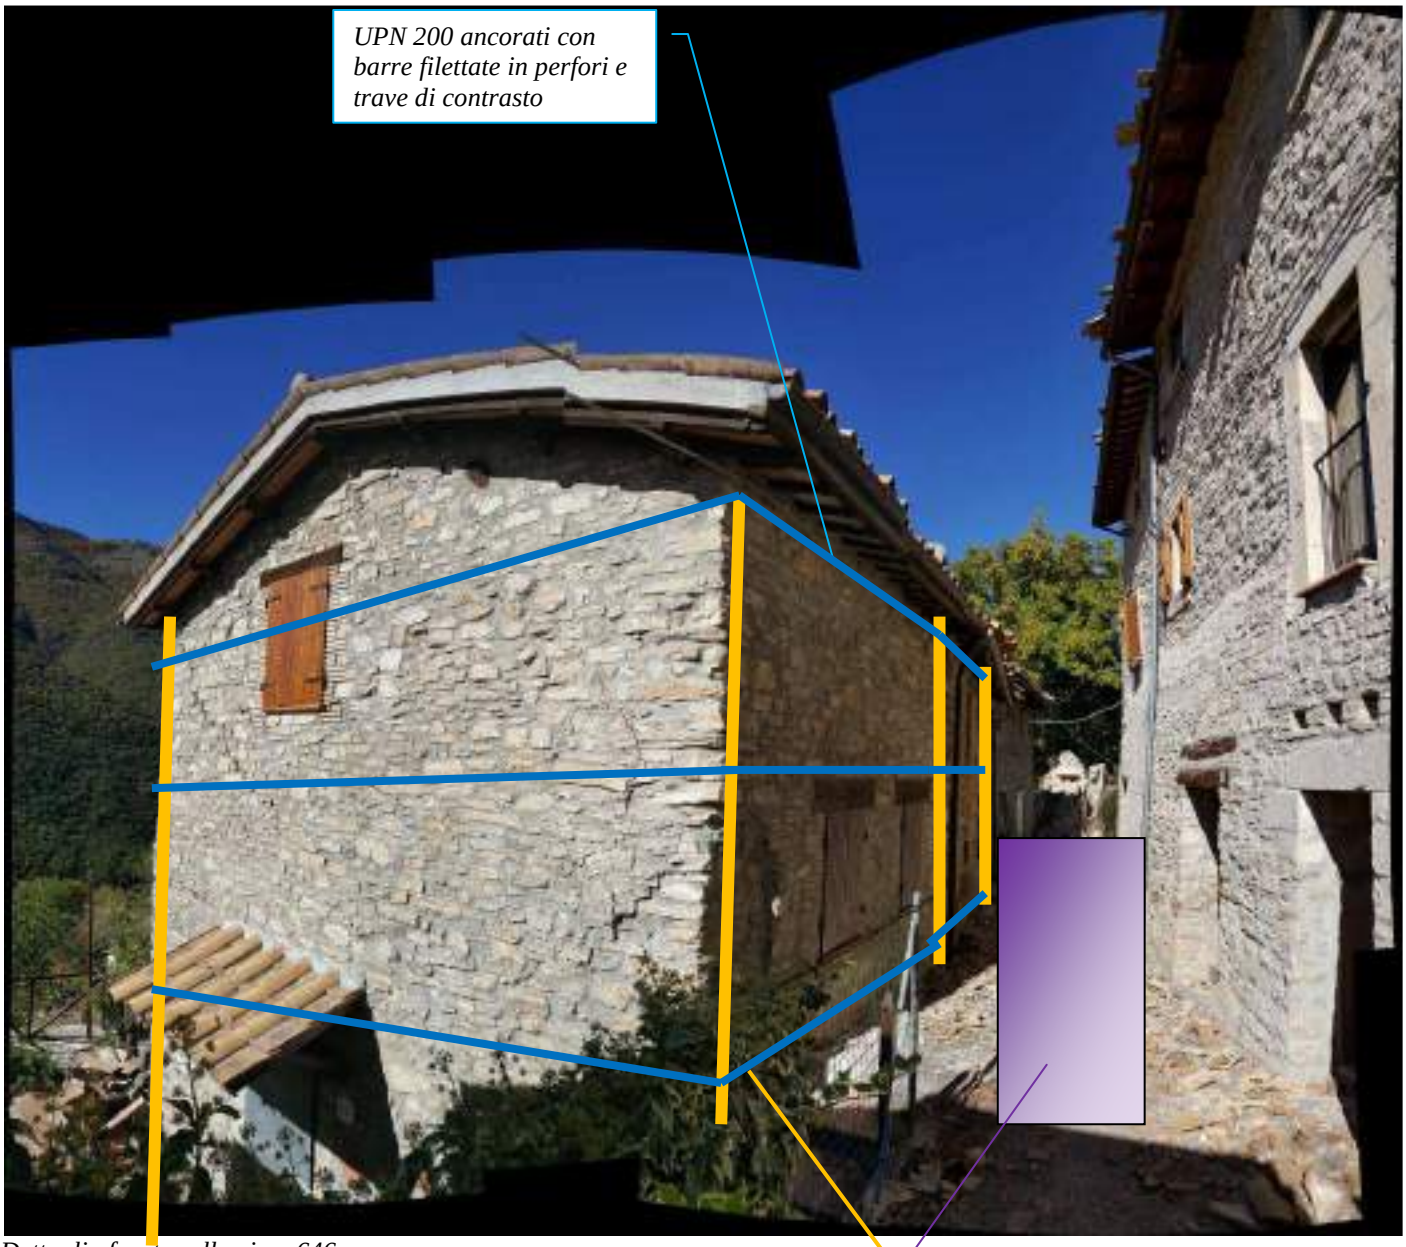


*Dettaglio fronte sulla via – 646*

***PORTALE CONTINUO*** *realizzato con elementi a telaio metallico (da ponteggio) e tavola metallica in testa rinforzata con secondo strato in legno e interposto strato di pvc, posto in opera al centro del vialetto e contrastato con canne tipo innocenti ai fabbricati. Tale realizzazione dovrà lasciare spazio libero tra il telaio stesso e le facciate dei fabbricati, al fine di consentire una eventuale ulteriore messa in sicurezza delle facciate se necessario e comunque di poter prendere misure, fare valutazioni senza interrompere la continuità visiva su tutte le facciate.*
***PRIMA della posa del tunnel andranno bonificati tutti i cornicioni***

ELEMENTI IN LEGNO 20X20 DI SOSTEGNO



STUDIO EMME ERRE INGEGNERIA
Via Dante Romagnoli 30 - 62100 Macerata - tel: 0733.969317
P.I:01358610432-C.F:RGHMRC71B01E783D-e.mail:marcorughini@libero.it

*5.4 Fase 4: p.lla 651/653*

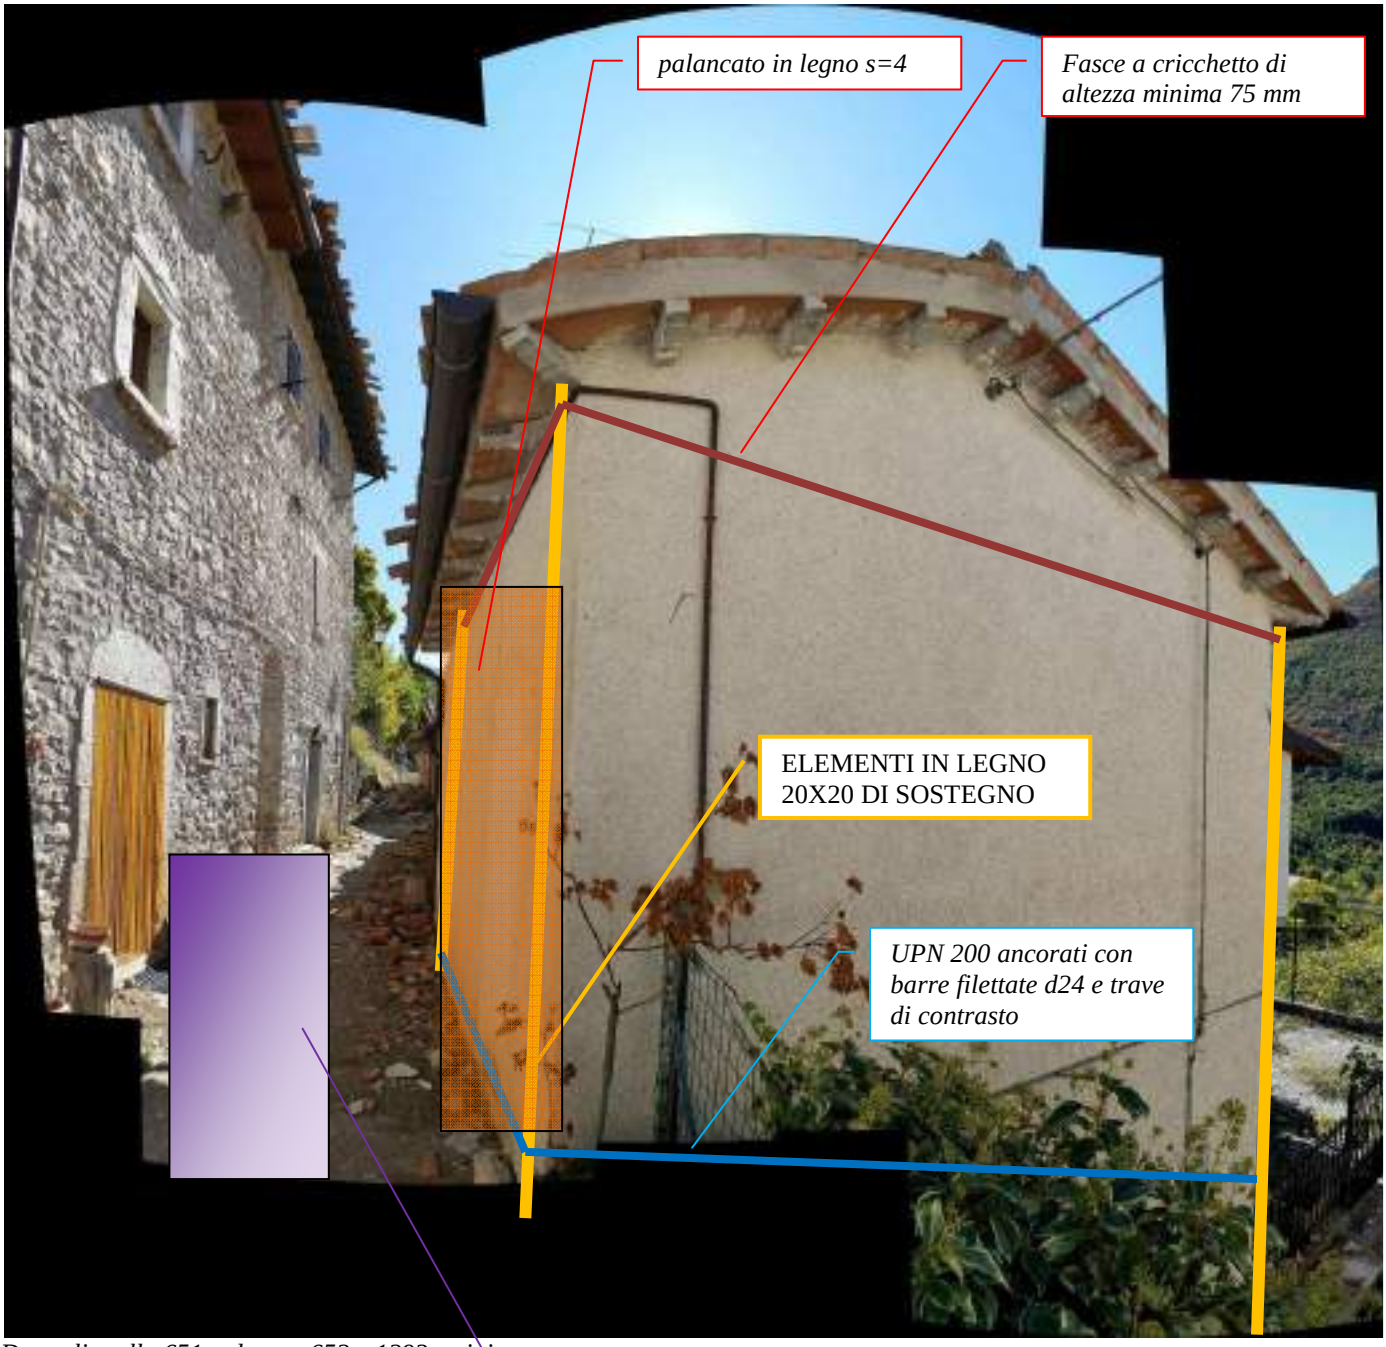


*Dettaglio p.lla 651 a destra, 652 e 1293 a sinistra*

***PORTALE CONTINUO*** *realizzato con elementi a telaio metallico (da ponteggio) e tavola metallica in testa rinforzata con secondo strato in legno e interposto strato di pvc, posto in opera al centro del vialetto e contrastato con canne tipo innocenti ai fabbricati. Tale realizzazione dovrà lasciare spazio libero tra il telaio stesso e le facciate dei fabbricati, al fine di consentire una eventuale ulteriore messa in sicurezza delle facciate se necessario e comunque di poter prendere misure, fare valutazioni senza interrompere la continuità visiva su tutte le facciate.*
***PRIMA della posa del tunnel andranno bonificati tutti i cornicioni***



MARCO RUGHINI
i n g e g n e r e

STUDIO EMME ERRE INGEGNERIA
Via Dante Romagnoli 30 - 62100 Macerata - tel: 0733.969317
P.I:01358610432-C.F:RGHMRC71B01E783D-e.mail:marcorughini@libero.it

*VISTA OPPOSTA ALLA PRECEDENTE: dettaglio p.lla 652 a sinistra - 652 a destra*

***PORTALE CONTINUO*** *realizzato con elementi a telaio metallico (da ponteggio) e tavola metallica in testa rinforzata con secondo strato in legno e interposto strato di pvc, posto in opera al centro del vialetto e contrastato con canne tipo innocenti ai fabbricati. Tale realizzazione dovrà lasciare spazio libero tra il telaio stesso e le facciate dei fabbricati, al fine di consentire una eventuale ulteriore messa in sicurezza delle facciate se necessario e comunque di poter prendere misure, fare valutazioni senza interrompere la continuità visiva su tutte le facciate.*

***PRIMA della posa del tunnel andranno bonificati tutti i cornicioni***

*UPN 200 ancorati con barre filettate d24 e trave di contrasto*



STUDIO EMME ERRE INGEGNERIA
Via Dante Romagnoli 30 - 62100 Macerata - tel: 0733.969317
P.I:01358610432-C.F:RGHMRC71B01E783D-e.mail:marcorughini@libero.it

*5.5 Fase 5: p.lla 677*

*Dettaglio p.lla 677*



MARCO RUGHINI
i n g e g n e r e

STUDIO EMME ERRE INGEGNERIA
Via Dante Romagnoli 30 - 62100 Macerata - tel: 0733.969317
P.I:01358610432-C.F:RGHMRC71B01E783D-e.mail:marcorughini@libero.it

*6. Prescrizioni generali*

*Il progetto di intervento di bonifica NON deve prevedere l'asportazione delle macerie ma la sola messa in sicurezza dei percorsi.*

*Per tale finalità, sono stati individuati i seguenti mezzi d'opera:*

- ***n.2 piattaforme o ragni, con estensione laterale sufficiente e capacità portante adeguata anche agli elementi in acciaio da sostenere.***

*7. Attività necessarie il dettaglio esecutivo*

*E' assolutamente necessario programmare la verifica delle particelle n.647/648/352/1293 prima di procedere alla messa in sicurezza progettata. Al fine di scongiurare la possibilità di un cedimento delle strutture nel loro complesso.*

*8. Allegato: computo metrico estimativo e QTE*

*Allegati di seguito*

*9. Allegato: planimetrie catastali ed elenco intestatari*

*Allegati di seguito*

*Macerata, li 24/10/2017*

*Ing. Marco Rughini*

**S T U D I O E M M E E R R E I N G E G N E R I A**
Via Dante Romagnoli 30 - 62100 Macerata - tel: 0733.969317
P.I:01358610432-C.F:RGHMRC71B01E783D-e.mail:marcorughini@libero.it

*COMUNE DI CASTEL SANTANGELO SUL NERA - MESSA IN SICUREZZA STRADE E PERCORSI PUBBLICI*

***STUDIO GENERALE E PROPOSTA DI INTERVENTO - INTERVENTO NOCRIA - VIA PIANA COMPARTO n.2***

*QUADRO TECNICO ECONOMICO DEI COSTI DI INTERVENTO*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ***QUADRO 1: Stima intervento - Prezziario Ricostruzione*** | | | |
| | ***Distinta interventi e costi*** | | *comp. pubblica* | | *sicurezza inclusa* | | |
| *1* | *Intervento su p.lle 640* | *€* | *7 718,00* | *€* | *231,54* | | |
| *2* | *Intervento su p.lle 646* | *€* | *10 368,22* | *€* | *311,05* | | |
| *3* | *Intervento su p.lle 651/653/654* | *€* | *4 299,02* | *€* | *128,97* | | |
| *4* | *Intervento su p.lle 647/648/652/1293* | *€* | *8 507,83* | *€* | *255,23* | | |
| *5* | *Intervento su p.lle 677* | *€* | *4 737,25* | *€* | *142,12* | | |
| *6* | *Camminamento protetto* | *€* | *2 386,00* | *€* | *71,58* | | |
| | | *€* | *38 016,32* | *€* | *1 140,49* | | |
| | *ribasso su* | *€* | *36 875,83* | | | | |
| | *Offerta -* | | *0,00%* | *€* | *-* | | |
| | *imoprto ribassato* | *€* | *36 875,83* | *€* | *1 140,49* | | |
| | *Importo di contratto* | *€* | *38 016,32* | | | | |
| | | | *Totale importi netti* | | *IVA 10%* | | *Sommano* |
| *A* | *Totale Lavori* | ***€*** | ***38 016,32*** | ***€*** | ***3 801,63*** | ***€*** | ***41 817,95*** |
| | ***Somme a Disposizione:*** | | | | *cassa e iva* | | |
| *B* | *Oneri tecnici 5%* | *€* | *1 900,82* | *€* | *510,94* | ***€*** | ***2 411,76*** |
| | | | ***QUADRO COMPLESSIVO SPESE NOCRIA VIA PIANA COMP2*** | | | | |
| | ***Importo complessivo (Circolare DPC 72035 del 22/12/2016-punto 1)*** | ***€*** | ***39 917,14*** | *€* | *4 312,57* | *€* | *44 229,71* |
| | *Imprevisti* | ***€*** | ***1 609,36*** | *€* | *160,94* | *€* | *1 770,29* |
| | | ***Totale impegno economico lordo*** | | | | ***€*** | ***46 000,00*** |
| | | ***Totale impegno economico arrotondato*** | | | | ***€*** | ***46 000,00*** |

# Comune di Castel Sant'Angelo sul Nera
Provincia di Macerata



# *COMPUTO METRICO*

**OGGETTO:** ***Frazione Nocria - Messa in sicurezza di strade e percorsi pubblici - INTERVENTO NOCRIA n.4 - NOCRIA via Piana n.2***

**COMMITTENTE:** ***Comune di Castel Sant'Angelo sul Nera***

Macerata, 12/10/2017

**IL TECNICO**
ing. Marco Rughini

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | |
| | **LAVORI A MISURA** | | | | | | | |
| | **Intervento su p.lla 640 (SpCat 1)** | | | | | | | |
| 1 / 1<br>F01065.a | Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, gruppo elettrogeno da KVA variabili. Il costo orario da computare per la sicurezza, in relazione al tipo di gruppo elettrogeno, è limitato al tempo occorrente per eseguire una o più specifiche fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Non è computabile, ai fini della sicurezza, il normale uso dell'attrezzatura, per eseguire le fasi ordinarie di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi espressamente previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel P.S.S.); il fermo attrezzatura; il gasolio per il funzionamento dell'attrezzatura durante l'esecuzione delle fasi specifiche di lavoro; l'allontanamento a fine opera. KWA: Potenza erogata dal gruppo elettrogeno. (Le dimensioni sotto riportate sono indicative). È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del gruppo elettrogeno. Misurato a costo orario al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori nelle fasi specifiche: gruppo elettrogeno KWA = 5<br>SpCat 1 - Intervento su p.lla 640<br>per tagli di parti lignee da separare a tetto | 3,00 | | | 8,000 | 24,00 | | |
| | SOMMANO ora | | | | | 24,00 | 9,60 | 230,40 |
| 2 / 2<br>F01057.a | Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di piattaforma autocarrata con autista operatore. Il costo orario da computare per la sicurezza, in relazione al tipo di piattaforma, è limitato al tempo occorrente per eseguire una o più specifiche fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Non è computabile, ai fini della sicurezza, il normale uso dell'attrezzatura, per eseguire le fasi ordinarie di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi espressamente previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel P.S.S.); il fermo macchina; il gasolio e l'autista operatore per il funzionamento del mezzo durante l'esecuzione delle fasi specifiche di lavoro; l'allontanamento a fine opera. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della piattaforma. H: Altezza di lavoro nella massima estensione; P: Portata in kg sulla piattaforma; HL: Altezza di lavoro in basso; N: Numero operatori presenti nella piattaforma. (Le dimensioni sotto riportate sono indicative). Misurato a costo orario al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori nelle fasi specifiche previste: piattaforma autocarrata H = 16; P = 200; HL = 0,00; N = 2<br>SpCat 1 - Intervento su p.lla 640<br>per tagli di parti lignee da separare a tetto | 4,00 | | | 8,000 | 32,00 | | |
| | SOMMANO ora | | | | | 32,00 | 47,60 | 1´523,20 |
| 3 / 10<br>A07001.a | Elementi portanti verticali a sezione rettangolare di legno massello o lamellare, con superfici in vista piallate, di sezione adeguata, opportunamente classificato in base alla norma UNI EN 338 come previsto dalla attuale normativa in materia di progettazione sismica, resistenza caratteristica a flessione 24 MPa, inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: abete e pino massello<br>SpCat 1 - Intervento su p.lla 640<br>per il sostegno dei due fronti | 4,00 | 0,20 | 0,200 | 5,000 | 0,80 | | |
| | SOMMANO m³ | | | | | 0,80 | 1´410,00 | 1´128,00 |
| 4 / 11<br>A05080 | Tavole in legno di abete dello spessore di 3-4 cm, fornite e poste in opera, per solai piani e per coperture, chiodate alla sottostante struttura in legno. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita<br>SpCat 1 - Intervento su p.lla 640 | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 2´881,60 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 2´881,60 |
| | protezione di entrambi gli angoli | 2,00 | 3,00 | 3,000 | 0,050 | 0,90 | | |
| | SOMMANO m³ | | | | | 0,90 | 1´005,00 | 904,50 |
| 5 / 12<br>A05038 | Fornitura e posa in opera di profilati in ferro, di qualsiasi forma (L; C; T; U; DoppioT; HEA; NP; PNP; ECC.) e sezione o lastre, fasce e simili, per rinforzo o sostituzione di elementi strutturali, incluso: pezzi speciali, piastre, tiranti, bulloni, tagli a misura, sfridi, saldature e mano di antiruggine<br>SpCat 1 - Intervento su p.lla 640<br>UPN 160 *(par.ug.=2+2) | 4,00 | 8,00 | | 19,000 | 608,00 | | |
| | SOMMANO kg | | | | | 608,00 | 4,37 | 2´656,96 |
| 6 / 13<br>A05034 | Ferro lavorato per catene, cerchiature e simili, di qualsiasi profilo e sezione incluso le chiavi o piastre di ancoraggio, i pezzi speciali, tagli a misura e sfridi, saldature, mano di antiruggine, sono compresi, inoltre, gli oneri per la realizzazione degli attraversamenti delle murature, le sigillature dei fori stessi, l'allettamento delle piastre con idonea malta e tutto quanto altro per dare il lavoro finito<br>SpCat 1 - Intervento su p.lla 640<br>Ø24 *(par.ug.=3+3) | 6,00 | 4,00 | | 3,551 | 85,22 | | |
| | SOMMANO kg | | | | | 85,22 | 7,02 | 598,24 |
| 7 / 14<br>A05023.c | Perforazione fino al diametro di 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con martello a rotopercussione a secco, per consolidamenti: per diametri fino a 26 mm in muratura di mattoni pieni<br>SpCat 1 - Intervento su p.lla 640<br>ancoraggi *(par.ug.=3+3+3+3) | 12,00 | | | 65,000 | 780,00 | | |
| | SOMMANO cm | | | | | 780,00 | 0,59 | 460,20 |
| 8 / 15<br>NP.01B | Fornitura e posa in opera di tenditori costituiti da fasce in fibra di poliestere h=75 mm comprensiva di cricchetto di tensionamento su appositi spessoramenti in legname da computarsi a parte.<br><br>Valutazione acquisto:<br>- fascia per un costo di acquisto stimato di 100 €/cad<br>- +10+15% = 100x1.1x1.15= 126.50 €<br><br>Valutazione posa in opera:<br>n.3 operatori x 1 ora, oltre quello computato eventualmente nella piattaforma:<br>- posa in opera: 3x30= 90 €<br><br>Complessivo:<br>126.50x5+90 = 216.50 €<br>dei quali, per la sicurezza: 90 € + 10 € = 100 €<br>SpCat 1 - Intervento su p.lla 640<br>parte alta | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | 216,50 | 216,50 |
| | Parziale Intervento su p.lla 640 (SpCat 1) euro | | | | | | | 7´718,00 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 7´718,00 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 7´718,00 |
| | **Intervento su p.lla 646 (SpCat 2)** | | | | | | | |
| 9 / 3<br>F01065.a | Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, gruppo elettrogeno da KVA variabili. Il costo orario da computare per la sicurezza, in relazione al tipo di gruppo elettrogeno, è limitato al tempo occorrente per eseguire una o più specifiche fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Non è computabile, ai fini della sicurezza, il normale uso dell'attrezzatura, per eseguire le fasi ordinarie di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi espressamente previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel P.S.S.); il fermo attrezzatura; il gasolio per il funzionamento dell'attrezzatura durante l'esecuzione delle fasi specifiche di lavoro; l'allontanamento a fine opera. KWA: Potenza erogata dal gruppo elettrogeno. (Le dimensioni sotto riportate sono indicative). È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del gruppo elettrogeno. Misurato a costo orario al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori nelle fasi specifiche: gruppo elettrogeno KWA = 5<br>SpCat 2 - Intervento su p.lla 646<br>per tagli di parti lignee da separare a tetto | 4,00 | | | 8,000 | 32,00 | | |
| | SOMMANO ora | | | | | 32,00 | 9,60 | 307,20 |
| 10 / 4<br>F01057.a | Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di piattaforma autocarrata con autista operatore. Il costo orario da computare per la sicurezza, in relazione al tipo di piattaforma, è limitato al tempo occorrente per eseguire una o più specifiche fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Non è computabile, ai fini della sicurezza, il normale uso dell'attrezzatura, per eseguire le fasi ordinarie di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi espressamente previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel P.S.S.); il fermo macchina; il gasolio e l'autista operatore per il funzionamento del mezzo durante l'esecuzione delle fasi specifiche di lavoro; l'allontanamento a fine opera. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della piattaforma. H: Altezza di lavoro nella massima estensione; P: Portata in kg sulla piattaforma; HL: Altezza di lavoro in basso; N: Numero operatori presenti nella piattaforma. (Le dimensioni sotto riportate sono indicative). Misurato a costo orario al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori nelle fasi specifiche previste: piattaforma autocarrata H = 16; P = 200; HL = 0,00; N = 2<br>SpCat 2 - Intervento su p.lla 646<br>per i tagli e le demolizioni di dettaglio | 4,00 | | | 8,000 | 32,00 | | |
| | SOMMANO ora | | | | | 32,00 | 47,60 | 1´523,20 |
| 11 / 5<br>A07001.a | Elementi portanti verticali a sezione rettangolare di legno massello o lamellare, con superfici in vista piallate, di sezione adeguata, opportunamente classificato in base alla norma UNI EN 338 come previsto dalla attuale normativa in materia di progettazione sismica, resistenza caratteristica a flessione 24 MPa, inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: abete e pino massello<br>SpCat 2 - Intervento su p.lla 646<br>per il sostegno dell'angolo tra la 934 e la 611 | 6,00 | 0,20 | 0,200 | 5,000 | 1,20 | | |
| | SOMMANO m³ | | | | | 1,20 | 1´410,00 | 1´692,00 |
| 12 / 6<br>A05080 | Tavole in legno di abete dello spessore di 3-4 cm, fornite e poste in opera, per solai piani e per coperture, chiodate alla sottostante struttura in legno. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita<br>SpCat 2 - Intervento su p.lla 646<br>protezione di entrambi gli angoli | 2,00 | 3,00 | 3,000 | 0,050 | 0,90 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 0,90 | | 11´240,40 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 0,90 | | 11´240,40 |
| | SOMMANO m³ | | | | | 0,90 | 1´005,00 | 904,50 |
| 13 / 7<br>A05038 | Fornitura e posa in opera di profilati in ferro, di qualsiasi forma (L; C; T; U; DoppioT; HEA; NP; PNP; ECC.) e sezione o lastre, fasce e simili, per rinforzo o sostituzione di elementi strutturali, incluso: pezzi speciali, piastre, tiranti, bulloni, tagli a misura, sfridi, saldature e mano di antiruggine<br>SpCat 2 - Intervento su p.lla 646<br>UPN 160 *(par.ug.=3+3) | 6,00 | 8,00 | | 19,000 | 912,00 | | |
| | SOMMANO kg | | | | | 912,00 | 4,37 | 3´985,44 |
| 14 / 8<br>A05034 | Ferro lavorato per catene, cerchiature e simili, di qualsiasi profilo e sezione incluso le chiavi o piastre di ancoraggio, i pezzi speciali, tagli a misura e sfridi, saldature, mano di antiruggine, sono compresi, inoltre, gli oneri per la realizzazione degli attraversamenti delle murature, le sigillature dei fori stessi, l'allettamento delle piastre con idonea malta e tutto quanto altro per dare il lavoro finito<br>SpCat 2 - Intervento su p.lla 646<br>Ø24 *(par.ug.=4+4+4) | 12,00 | 5,00 | | 3,551 | 213,06 | | |
| | SOMMANO kg | | | | | 213,06 | 7,02 | 1´495,68 |
| 15 / 9<br>A05023.c | Perforazione fino al diametro di 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con martello a rotopercussione a secco, per consolidamenti: per diametri fino a 26 mm in muratura di mattoni pieni<br>SpCat 2 - Intervento su p.lla 646<br>ancoraggi *(par.ug.=4+4+4) | 12,00 | | | 65,000 | 780,00 | | |
| | SOMMANO cm | | | | | 780,00 | 0,59 | 460,20 |
| | Parziale Intervento su p.lla 646 (SpCat 2) euro | | | | | | | 10´368,22 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 18´086,22 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 18´086,22 |
| | **Intervento su p.lla 651/653/654 (SpCat 3)** | | | | | | | |
| 16 / 16<br>F01065.a | Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, gruppo elettrogeno da KVA variabili. Il costo orario da computare per la sicurezza, in relazione al tipo di gruppo elettrogeno, è limitato al tempo occorrente per eseguire una o più specifiche fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Non è computabile, ai fini della sicurezza, il normale uso dell'attrezzatura, per eseguire le fasi ordinarie di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi espressamente previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel P.S.S.); il fermo attrezzatura; il gasolio per il funzionamento dell'attrezzatura durante l'esecuzione delle fasi specifiche di lavoro; l'allontanamento a fine opera. KWA: Potenza erogata dal gruppo elettrogeno. (Le dimensioni sotto riportate sono indicative). È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del gruppo elettrogeno. Misurato a costo orario al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori nelle fasi specifiche: gruppo elettrogeno KWA = 5<br>SpCat 3 - Intervento su p.lla 651/653/654<br>per tagli di parti lignee da separare a tetto | 3,00 | | | 8,000 | 24,00 | | |
| | SOMMANO ora | | | | | 24,00 | 9,60 | 230,40 |
| 17 / 17<br>F01057.a | Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di piattaforma autocarrata con autista operatore. Il costo orario da computare per la sicurezza, in relazione al tipo di piattaforma, è limitato al tempo occorrente per eseguire una o più specifiche fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Non è computabile, ai fini della sicurezza, il normale uso dell'attrezzatura, per eseguire le fasi ordinarie di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi espressamente previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel P.S.S.); il fermo macchina; il gasolio e l'autista operatore per il funzionamento del mezzo durante l'esecuzione delle fasi specifiche di lavoro; l'allontanamento a fine opera. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della piattaforma. H: Altezza di lavoro nella massima estensione; P: Portata in kg sulla piattaforma; HL: Altezza di lavoro in basso; N: Numero operatori presenti nella piattaforma. (Le dimensioni sotto riportate sono indicative). Misurato a costo orario al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori nelle fasi specifiche previste: piattaforma autocarrata H = 16; P = 200; HL = 0,00; N = 2<br>SpCat 3 - Intervento su p.lla 651/653/654<br>per i tagli e le demolizioni di dettaglio | 2,00 | | | 8,000 | 16,00 | | |
| | SOMMANO ora | | | | | 16,00 | 47,60 | 761,60 |
| 18 / 18<br>A07001.a | Elementi portanti verticali a sezione rettangolare di legno massello o lamellare, con superfici in vista piallate, di sezione adeguata, opportunamente classificato in base alla norma UNI EN 338 come previsto dalla attuale normativa in materia di progettazione sismica, resistenza caratteristica a flessione 24 MPa, inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: abete e pino massello<br>SpCat 3 - Intervento su p.lla 651/653/654<br>per il sostegno dell'angolo tra la 934 e la 611 | 4,00 | 0,20 | 0,200 | 5,000 | 0,80 | | |
| | SOMMANO m³ | | | | | 0,80 | 1´410,00 | 1´128,00 |
| 19 / 19<br>A05080 | Tavole in legno di abete dello spessore di 3-4 cm, fornite e poste in opera, per solai piani e per coperture, chiodate alla sottostante struttura in legno. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita<br>SpCat 3 - Intervento su p.lla 651/653/654<br>protezione di entrambi gli angoli | | 4,00 | 3,000 | 0,050 | 0,60 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 0,60 | | 20´206,22 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 0,60 | | 20´206,22 |
| | SOMMANO m³ | | | | | 0,60 | 1´005,00 | 603,00 |
| 20 / 20<br>A05038 | Fornitura e posa in opera di profilati in ferro, di qualsiasi forma (L; C; T; U; DoppioT; HEA; NP; PNP; ECC.) e sezione o lastre, fasce e simili, per rinforzo o sostituzione di elementi strutturali, incluso: pezzi speciali, piastre, tiranti, bulloni, tagli a misura, sfridi, saldature e mano di antiruggine<br>SpCat 3 - Intervento su p.lla 651/653/654 | | | | | | | |
| | UPN 160 | 2,00 | 5,00 | | 19,000 | 190,00 | | |
| | SOMMANO kg | | | | | 190,00 | 4,37 | 830,30 |
| 21 / 21<br>A05034 | Ferro lavorato per catene, cerchiature e simili, di qualsiasi profilo e sezione incluso le chiavi o piastre di ancoraggio, i pezzi speciali, tagli a misura e sfridi, saldature, mano di antiruggine, sono compresi, inoltre, gli oneri per la realizzazione degli attraversamenti delle murature, le sigillature dei fori stessi, l'allettamento delle piastre con idonea malta e tutto quanto altro per dare il lavoro finito<br>SpCat 3 - Intervento su p.lla 651/653/654 | | | | | | | |
| | Ø24 | 3,00 | 4,00 | | 3,551 | 42,61 | | |
| | SOMMANO kg | | | | | 42,61 | 7,02 | 299,12 |
| 22 / 22<br>A05023.c | Perforazione fino al diametro di 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con martello a rotopercussione a secco, per consolidamenti: per diametri fino a 26 mm in muratura di mattoni pieni<br>SpCat 3 - Intervento su p.lla 651/653/654 | | | | | | | |
| | ancoraggi *(par.ug.=3+3) | 6,00 | | | 65,000 | 390,00 | | |
| | SOMMANO cm | | | | | 390,00 | 0,59 | 230,10 |
| 23 / 33<br>NP.01B | Fornitura e posa in opera di tenditori costituiti da fasce in fibra di poliestere h=75 mm comprensiva di cricchetto di tensionamento su appositi spessoramenti in legname da computarsi a parte.<br><br>Valutazione acquisto:<br>- fascia per un costo di acquisto stimato di 100 €/cad<br>- +10+15% = 100x1.1x1.15= 126.50 €<br><br>Valutazione posa in opera:<br>n.3 operatori x 1 ora, oltre quello computato eventualmente nella piattaforma:<br>- posa in opera: 3x30= 90 €<br><br>Complessivo:<br>126.50x5+90 = 216.50 €<br>dei quali, per la sicurezza: 90 € + 10 € = 100 €<br>SpCat 3 - Intervento su p.lla 651/653/654 | | | | | | | |
| | | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | 216,50 | 216,50 |
| | Parziale Intervento su p.lla 651/653/654 (SpCat 3) euro<br>---<br>---<br>---<br>---<br>---<br>---<br>---<br>---<br>---<br>---<br>---<br>---<br>---<br>---<br>---<br>---<br>---<br>---<br>--- | | | | | | | 4´299,02 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 22´385,24 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 22´385,24 |
| | **Intervento su p.lla 647/648/652/1293 (SpCat 4)** | | | | | | | |
| 24 / 27<br>F01065.a | Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, gruppo elettrogeno da KVA variabili. Il costo orario da computare per la sicurezza, in relazione al tipo di gruppo elettrogeno, è limitato al tempo occorrente per eseguire una o più specifiche fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Non è computabile, ai fini della sicurezza, il normale uso dell'attrezzatura, per eseguire le fasi ordinarie di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi espressamente previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel P.S.S.); il fermo attrezzatura; il gasolio per il funzionamento dell'attrezzatura durante l'esecuzione delle fasi specifiche di lavoro; l'allontanamento a fine opera. KWA: Potenza erogata dal gruppo elettrogeno. (Le dimensioni sotto riportate sono indicative). È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del gruppo elettrogeno. Misurato a costo orario al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori nelle fasi specifiche: gruppo elettrogeno KWA = 5<br>SpCat 4 - Intervento su p.lla 647/648/652/1293<br>per tagli di parti lignee da separare a tetto | 4,00 | | | 8,000 | 32,00 | | |
| | SOMMANO ora | | | | | 32,00 | 9,60 | 307,20 |
| 25 / 28<br>F01057.a | Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di piattaforma autocarrata con autista operatore. Il costo orario da computare per la sicurezza, in relazione al tipo di piattaforma, è limitato al tempo occorrente per eseguire una o più specifiche fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Non è computabile, ai fini della sicurezza, il normale uso dell'attrezzatura, per eseguire le fasi ordinarie di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi espressamente previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel P.S.S.); il fermo macchina; il gasolio e l'autista operatore per il funzionamento del mezzo durante l'esecuzione delle fasi specifiche di lavoro; l'allontanamento a fine opera. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della piattaforma. H: Altezza di lavoro nella massima estensione; P: Portata in kg sulla piattaforma; HL: Altezza di lavoro in basso; N: Numero operatori presenti nella piattaforma. (Le dimensioni sotto riportate sono indicative). Misurato a costo orario al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori nelle fasi specifiche previste: piattaforma autocarrata H = 16; P = 200; HL = 0,00; N = 2<br>SpCat 4 - Intervento su p.lla 647/648/652/1293<br>per i tagli e le demolizioni di dettaglio | 5,00 | | | 8,000 | 40,00 | | |
| | SOMMANO ora | | | | | 40,00 | 47,60 | 1´904,00 |
| 26 / 29<br>A05080 | Tavole in legno di abete dello spessore di 3-4 cm, fornite e poste in opera, per solai piani e per coperture, chiodate alla sottostante struttura in legno. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita<br>SpCat 4 - Intervento su p.lla 647/648/652/1293<br>protezione di entrambi gli angoli | 2,00 | 3,00 | 3,000 | 0,050 | 0,90 | | |
| | SOMMANO m³ | | | | | 0,90 | 1´005,00 | 904,50 |
| 27 / 30<br>A05038 | Fornitura e posa in opera di profilati in ferro, di qualsiasi forma (L; C; T; U; DoppioT; HEA; NP; PNP; ECC.) e sezione o lastre, fasce e simili, per rinforzo o sostituzione di elementi strutturali, incluso: pezzi speciali, piastre, tiranti, bulloni, tagli a misura, sfridi, saldature e mano di antiruggine<br>SpCat 4 - Intervento su p.lla 647/648/652/1293<br>UPN 160 *(par.ug.=2+2) | 4,00 | 10,00 | | 19,000 | 760,00 | | |
| | SOMMANO kg | | | | | 760,00 | 4,37 | 3´321,20 |
| 28 / 31<br>A05034 | Ferro lavorato per catene, cerchiature e simili, di qualsiasi profilo e sezione incluso le chiavi o piastre di ancoraggio, i pezzi speciali, tagli a misura e sfridi, saldature, mano di antiruggine, sono compresi, inoltre, gli oneri per la realizzazione degli attraversamenti delle murature, le sigillature dei fori stessi, l'allettamento delle piastre con idonea malta e tutto quanto altro per | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 28´822,14 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 28´822,14 |
| | dare il lavoro finito<br>SpCat 4 - Intervento su p.lla 647/648/652/1293<br>Ø24 *(par.ug.=5+5) | 10,00 | 6,00 | | 3,551 | 213,06 | | |
| | SOMMANO kg | | | | | 213,06 | 7,02 | 1´495,68 |
| 29 / 32<br>A05023.c | Perforazione fino al diametro di 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con martello a rotopercussione a secco, per consolidamenti: per diametri fino a 26 mm in muratura di mattoni pieni<br>SpCat 4 - Intervento su p.lla 647/648/652/1293<br>ancoraggi *(par.ug.=5+5+5) | 15,00 | | | 65,000 | 975,00 | | |
| | SOMMANO cm | | | | | 975,00 | 0,59 | 575,25 |
| | Parziale Intervento su p.lla 647/648/652/1293 (SpCat 4) euro | | | | | | | 8´507,83 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 30´893,07 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 30´893,07 |
| | **Intervento su p.lla 677 (SpCat 5)** | | | | | | | |
| 30 / 23<br>F01065.a | Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, gruppo elettrogeno da KVA variabili. Il costo orario da computare per la sicurezza, in relazione al tipo di gruppo elettrogeno, è limitato al tempo occorrente per eseguire una o più specifiche fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Non è computabile, ai fini della sicurezza, il normale uso dell'attrezzatura, per eseguire le fasi ordinarie di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi espressamente previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel P.S.S.); il fermo attrezzatura; il gasolio per il funzionamento dell'attrezzatura durante l'esecuzione delle fasi specifiche di lavoro; l'allontanamento a fine opera. KWA: Potenza erogata dal gruppo elettrogeno. (Le dimensioni sotto riportate sono indicative). È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del gruppo elettrogeno. Misurato a costo orario al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori nelle fasi specifiche: gruppo elettrogeno KWA = 5<br>SpCat 5 - Intervento su p.lla 677<br>per tagli di parti lignee da separare a tetto | 4,00 | | | 8,000 | 32,00 | | |
| | SOMMANO ora | | | | | 32,00 | 9,60 | 307,20 |
| 31 / 24<br>F01057.a | Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di piattaforma autocarrata con autista operatore. Il costo orario da computare per la sicurezza, in relazione al tipo di piattaforma, è limitato al tempo occorrente per eseguire una o più specifiche fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Non è computabile, ai fini della sicurezza, il normale uso dell'attrezzatura, per eseguire le fasi ordinarie di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi espressamente previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel P.S.S.); il fermo macchina; il gasolio e l'autista operatore per il funzionamento del mezzo durante l'esecuzione delle fasi specifiche di lavoro; l'allontanamento a fine opera. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della piattaforma. H: Altezza di lavoro nella massima estensione; P: Portata in kg sulla piattaforma; HL: Altezza di lavoro in basso; N: Numero operatori presenti nella piattaforma. (Le dimensioni sotto riportate sono indicative). Misurato a costo orario al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori nelle fasi specifiche previste: piattaforma autocarrata H = 16; P = 200; HL = 0,00; N = 2<br>SpCat 5 - Intervento su p.lla 677<br>per i tagli e le demolizioni di dettaglio | 3,00 | | | 8,000 | 24,00 | | |
| | SOMMANO ora | | | | | 24,00 | 47,60 | 1´142,40 |
| 32 / 25<br>A07001.a | Elementi portanti verticali a sezione rettangolare di legno massello o lamellare, con superfici in vista piallate, di sezione adeguata, opportunamente classificato in base alla norma UNI EN 338 come previsto dalla attuale normativa in materia di progettazione sismica, resistenza caratteristica a flessione 24 MPa, inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: abete e pino massello<br>SpCat 5 - Intervento su p.lla 677<br>per il sostegno dell'angolo tra la 934 e la 611 | 4,00 | 0,20 | 0,200 | 5,000 | 0,80 | | |
| | SOMMANO m³ | | | | | 0,80 | 1´410,00 | 1´128,00 |
| 33 / 26<br>A05080 | Tavole in legno di abete dello spessore di 3-4 cm, fornite e poste in opera, per solai piani e per coperture, chiodate alla sottostante struttura in legno. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita<br>SpCat 5 - Intervento su p.lla 677<br>protezione di entrambi gli angoli | 3,00 | 3,00 | 3,000 | 0,050 | 1,35 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 1,35 | | 33´470,67 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 1,35 | | 33´470,67 |
| | SOMMANO m³ | | | | | 1,35 | 1´005,00 | 1´356,75 |
| 34 / 34<br>A05023.c | Perforazione fino al diametro di 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con martello a rotopercussione a secco, per consolidamenti: per diametri fino a 26 mm in muratura di mattoni pieni<br>SpCat 5 - Intervento su p.lla 677<br>per passare con le fasce a cricchetto *(par.ug.=2+2) | 4,00 | | | 65,000 | 260,00 | | |
| | SOMMANO cm | | | | | 260,00 | 0,59 | 153,40 |
| 35 / 35<br>NP.01B | Fornitura e posa in opera di tenditori costituiti da fasce in fibra di poliestere h=75 mm comprensiva di cricchetto di tensionamento su appositi spessoramenti in legname da computarsi a parte.<br><br>Valutazione acquisto:<br>- fascia per un costo di acquisto stimato di 100 €/cad<br>- +10+15% = 100x1.1x1.15= 126.50 €<br><br>Valutazione posa in opera:<br>n.3 operatori x 1 ora, oltre quello computato eventualmente nella piattaforma:<br>- posa in opera: 3x30= 90 €<br><br>Complessivo:<br>126.50x5+90 = 216.50 €<br>dei quali, per la sicurezza: 90 € + 10 € = 100 €<br>SpCat 5 - Intervento su p.lla 677 | | | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 3,00 | 216,50 | 649,50 |
| | Parziale Intervento su p.lla 677 (SpCat 5) euro | | | | | | | 4´737,25 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 35´630,32 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 35´630,32 |
| | **Camminamento protetto (SpCat 6)** | | | | | | | |
| 36 / 36<br>F01003.c | Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggio metallico modulare (maglia standard m 1,10 x 1,80), costituito da rosette a più fori solidali ai montanti, alle quali vengono collegati correnti e diagonali in opera. Sono compresi: la fornitura di tutti gli elementi necessari per la costruzione del ponteggio; il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; le tavole fermapiede e i parapetti; le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; le basette; i diagonali; gli ancoraggi; la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l'autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti. La misurazione è effettuata a nodo, per ogni mese o frazione, in relazione al calcolo strutturale, se previsto: fornitura all'interno di vani con altezza netta dei medesimi superiore a m 3,50 o spazi circoscritti a cielo aperto, per il primo mese o frazione<br>SpCat 6 - Camminamento protetto<br>per lo snodo all'interno di tutto il viottolo | | | | | 100,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 100,00 | 13,30 | 1´330,00 |
| 37 / 37<br>F01002.b | Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggio metallico fisso costituito da elementi tubolari in acciaio e giunti in acciaio realizzati in opera. Sono compresi: la fornitura di tutti gli elementi necessari per la costruzione del ponteggio; il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; le tavole ferma piede e i parapetti; le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; le basette; i diagonali; gli ancoraggi; la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l'autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti. La misurazione è effettuata a giunto, per ogni mese o frazione, in relazione al calcolo strutturale, se previsto: fornitura all'esterno di manufatti per l'intera durata dei lavori, per ogni mese in più o frazione<br>SpCat 6 - Camminamento protetto<br>per lo snodo all'interno di tutto il viottolo | 100,00 | | | 11,000 | 1´100,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1´100,00 | 0,96 | 1´056,00 |
| | Parziale Camminamento protetto (SpCat 6) euro | | | | | | | 2´386,00 |
| | **Parziale LAVORI A MISURA euro** | | | | | | | 38´016,32 |
| | **T O T A L E euro** | | | | | | | 38´016,32 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI TOTALE |
|---|---|---|
| | R I P O R T O | |
| | **Riepilogo SUPER CATEGORIE** | |
| 001 | **Intervento su p.lla 640** | 7´718,00 |
| 002 | **Intervento su p.lla 646** | 10´368,22 |
| 003 | **Intervento su p.lla 651/653/654** | 4´299,02 |
| 004 | **Intervento su p.lla 647/648/652/1293** | 8´507,83 |
| 005 | **Intervento su p.lla 677** | 4´737,25 |
| 006 | **Camminamento protetto** | 2´386,00 |
| | **Totale SUPER CATEGORIE euro** | 38´016,32 |
| | A R I P O R T A R E | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI TOTALE |
|---|---|---|
| | R I P O R T O | |
| | **Riepilogo Strutturale CATEGORIE** | |
| M | **LAVORI A MISURA euro** | 38´016,32 |
| M:001 | Intervento su p.lla 640 euro | 7´718,00 |
| M:002 | Intervento su p.lla 646 euro | 10´368,22 |
| M:003 | Intervento su p.lla 651/653/654 euro | 4´299,02 |
| M:004 | Intervento su p.lla 647/648/652/1293 euro | 8´507,83 |
| M:005 | Intervento su p.lla 677 euro | 4´737,25 |
| M:006 | Camminamento protetto euro | 2´386,00 |
| | **TOTALE euro** | 38´016,32 |

Macerata, 12/10/2017

**Il Tecnico**
ing. Marco Rughini

| | |
|---|---|
| | A R I P O R T A R E |

Catasto: **Fabbricati**

Comune di: **CASTELSANTANGELO SUL NERA** Codice: **C267**
Foglio: **12** Particella: **640**
Immobili individuati: **3**

Elenco Immobili

| | Foglio | Particella | Sub | Indirizzo | Zona cens | Categoria | Classe | Consistenza | Rendita | Partita | Altri Dati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12 | 640 | 2 | CASTELSANTANGELO SUL NERA VIA PIANA, 21 Piano T-S1 | | A/5 | 1 | 4,5 vani | Euro:55,78 | | SI |
| | 12 | 640 | 3 | CASTELSANTANGELO SUL NERA VIA PIE DI NOCRIA, Piano S1-T - 1 | | F/2 COLLABENTE | | | | | |
| | 12 | 640 | 4 | CASTELSANTANGELO SUL NERA VIA PIE DI NOCRIA, Piano S1-T | | F/2 COLLABENTE | | | | | |

-

## Foglio:**12** Particella:**640** Subalterno:**2** (PLANIMETRIA NON EVADIBILE)

Elenco Intestati

| | Nominativo o denominazione | Codice fiscale | Titolarità | Quota | Altri dati |
|---|---|---|---|---|---|
| | GIROLAMI PAOLA nata a ROMA (RM) il 24/06/1964 | GRLPLA64H64H501W | Proprieta' | 1/2 | |
| | GIROLAMI SANDRA nata a ROMA (RM) il 24/03/1959 | GRLSDR59C64H501K | Proprieta' | 1/2 | |

## Foglio:**12** Particella:**640** Subalterno:**3**

Elenco Intestati

| | Nominativo o denominazione | Codice fiscale | Titolarità | Quota | Altri dati |
|---|---|---|---|---|---|
| | CURRE PAOLO nato a ROMA (RM) il 16/06/1966 | CRRPLA66H16H501T | Proprieta' | 1/1 | |

## Foglio:**12** Particella:**640** Subalterno:**4**

Elenco Intestati

| | Nominativo o denominazione | Codice fiscale | Titolarità | Quota | Altri dati |
|---|---|---|---|---|---|
| | CARDURANI BRUNO nato a VISSO (MC) il 14/02/1944 | CRDBRN44B14M078J | Proprieta' | | |

Catasto: **Fabbricati**

Comune di: **CASTELSANTANGELO SUL NERA** Codice: **C267**
Foglio: **12** Particella: **646**
Immobili individuati: **4**

Elenco Immobili

| | Foglio | Particella | Sub | Indirizzo | Zona cens | Categoria | Classe | Consistenza | Rendita | Partita | Altri Dati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12 | 646 | 1 | CASTELSANTANGELO SUL NERA | | | | | | Soppressa | |
| | 12 | 646 | 3 | CASTELSANTANGELO SUL NERA VIA PIANA, SNC Piano T-1 - S1 | | A/4 | 1 | 2,5 vani | Euro:72,30 | | |
| | 12 | 646 | 4 | CASTELSANTANGELO SUL NERA VIA PIANA, SNC Piano T-1 - S1 | | A/4 | 1 | 4,5 vani | Euro:130,15 | | |
| | 12 | 646 | 5 | CASTELSANTANGELO SUL NERA VIA PIANA, 10 Piano T-1 - S1 | | A/4 | 1 | 5,5 vani | Euro:159,07 | | |

-

## Foglio:**12** Particella:**646** Subalterno:**3**

Elenco Intestati

| | Nominativo o denominazione | Codice fiscale | Titolarità | Quota | Altri da |
|---|---|---|---|---|---|
| | GIOVANNINI GIUSEPPINA nata a CASTELSANTANGELO SUL NERA (MC) il 21/07/1944 | GVNGPP44L61C267D | Proprieta' | 1/1 | |

## Foglio:**12** Particella:**646** Subalterno:**4**

Elenco Intestati

| | Nominativo o denominazione | Codice fiscale | Titolarità | Quota | Altri da |
|---|---|---|---|---|---|
| | GIOVANNINI ADRIANA nata a CASTELSANTANGELO SUL NERA (MC) il 08/05/1941 | GVNDRN41E48C267W | Proprieta' | 1/1 | |

## Foglio:**12** Particella:**646** Subalterno:**5**

Elenco Intestati

| | Nominativo o denominazione | Codice fiscale | Titolarità | Quota | Altri da |
|---|---|---|---|---|---|
| | GIOVANNINI SILVANA nata a CASTELSANTANGELO SUL NERA (MC) il 13/04/1938 | GVNSVN38D53C267F | Proprieta' | 1/1 | |

Comune di: **CASTELSANTANGELO SUL NERA** Codice: **C267**
Foglio: **12** Particella: **651**
Immobili individuati: **2**

Elenco Immobili

| | Foglio | Particella | Sub | Indirizzo | Zona cens | Categoria | Classe | Consistenza | Rendita | Partita | Altri Dati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12 | 651 | 2 | CASTELSANTANGELO SUL NERA Piano - int. | | | | | | Soppressa | |
| | 12 | 651 | 3 | CASTELSANTANGELO SUL NERA VIA PIANA, Piano T-1 | | A/3 | 1 | 2,5 vani | Euro:116,20 | | |

-

## Foglio:**12** Particella:**651** Subalterno:**3**

Elenco Intestati

| | Nominativo o denominazione | Codice fiscale | Titolarità | Quota | Altri dati |
|---|---|---|---|---|---|
| | TOMBINI RENATO nato a ROMA (RM) il 09/11/1957 | TMBRNT57S09H501Z | Proprieta' | 1/1 | |

Catasto: **Fabbricati**

Comune di: **CASTELSANTANGELO SUL NERA** Codice: **C267**
Foglio: **12** Particella: **653**
Immobili individuati: **1**

Elenco Immobili

| | Foglio | Particella | Sub | Indirizzo | Zona cens | Categoria | Classe | Consistenza | Rendita | Partita | Altri Dati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12 | 653 | | CASTELSANTANGELO SUL NERA VIA SARPONICCHIO, SNC Piano T-1 | | C/2 | 2 | 52 mq | Euro:51,03 | | |

-

## Foglio:**12** Particella:**653 - 654**

Elenco Intestati

| | Nominativo o denominazione | Codice fiscale | Titolarità | Quota | Altri dati |
|---|---|---|---|---|---|
| | MARINELLI ADRIANO nato a ROMA (RM) il 14/07/1954 | MRNDRN54L14H501A | Proprieta' | 1/2 | |
| | MARINELLI ORIETTA nata a ROMA (RM) il 23/09/1959 | MRNRTT59P63H501H | Proprieta' | 1/2 | |

Catasto: **Fabbricati**

Comune di: **CASTELSANTANGELO SUL NERA** Codice: **C267**
Foglio: **12** Particella: **654**
Immobili individuati: **1**

Elenco Immobili

| | Foglio | Particella | Sub | Indirizzo | Zona cens | Categoria | Classe | Consistenza | Rendita | Partita | Altri Dati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12 | 654 | | CASTELSANTANGELO SUL NERA VIA PIANA, Piano T-S1 | | C/2 | 3 | 41 mq | Euro:48,70 | | |

## Foglio:**12** Particella:**654 – 652** - **1293 Subalterno:2**

Elenco Intestati

| | Nominativo o denominazione | Codice fiscale | Titolarità | Quota | Altri dati |
|---|---|---|---|---|---|
| | MARINELLI ADRIANO nato a ROMA (RM) il 14/07/1954 | MRNDRN54L14H501A | Proprieta' | 1/2 | |
| | MARINELLI ORIETTA nata a ROMA (RM) il 23/09/1959 | MRNRTT59P63H501H | Proprieta' | 1/2 | |

Catasto: **Fabbricati**

Comune di: **CASTELSANTANGELO SUL NERA** Codice: **C267**
Foglio: **12** Particella: **677**
Immobili individuati: **1**

Elenco Immobili

| | Foglio | Particella | Sub | Indirizzo | Zona cens | Categoria | Classe | Consistenza | Rendita | Partita | Altri Dati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12 | 677 | | CASTELSANTANGELO SUL NERA VIA PIE DI NOCRIA, SNC Piano T-1 | | A/3 | 2 | 3 vani | Euro:162,68 | | |

-

## Foglio:**12** Particella:**677**

Elenco Intestati

| | Nominativo o denominazione | Codice fiscale | Titolarità | Quota | Altri dat |
|---|---|---|---|---|---|
| | BUCCIARELLI GIOVANNI nato a ROMA (RM) il 22/12/1964 | BCCGNN64T22H501C | Proprieta' | 1000/1000 | |

Comune di: **CASTELSANTANGELO SUL NERA** Codice: **C267**
Foglio: **12** Particella: **647**
Immobili individuati: **3**

Elenco Immobili

| | Foglio | Particella | Sub | Indirizzo | Zona cens | Categoria | Classe | Consistenza | Rendita | Partita | Altri Dati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12 | 647 | 2 | CASTELSANTANGELO SUL NERA Piano - int. | | | | | | Soppressa | |
| | 12 | 647 | 3 | CASTELSANTANGELO SUL NERA | | | | | | Soppressa | |
| | 12 | 647 | 4 | CASTELSANTANGELO SUL NERA VIA PIE DI NOCRIA, SC Piano T-1 - S1 | | A/3 | 1 | 6 vani | Euro:278,89 | | SI |

Catasto: **Fabbricati** Comune: **CASTELSANTANGELO SUL NERA** Codice: **C267**
Foglio:**12** Particella:**647** Subalterno:**4**

Elenco Intestati

| | Nominativo o denominazione | Codice fiscale | Titolarità | Quota | Altri dat |
|---|---|---|---|---|---|
| | RAFFA ROSA nata a VILLANOVA DEL BATTISTA (AV) il 27/02/1941 | RFFRSO41B67L973S | Proprieta' | 1/2 | |
| | SQUARCIA LUCIANO nato a NETTUNO (RM) il 19/07/1941 | SQRLCN41L19F880E | Proprieta' | 1/2 | |

Catasto: **Fabbricati**

Comune di: **CASTELSANTANGELO SUL NERA** Codice: **C267**
Foglio: **12** Particella: **648**
Immobili individuati: **7**

Elenco Immobili

| | Foglio | Particella | Sub | Indirizzo | Zona cens | Categoria | Classe | Consistenza | Rendita | Partita | Altri Dati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12 | 648 | 1 | CASTELSANTANGELO SUL NERA VIA SARPONICCHIO, SNC Piano S1 | | C/2 | 2 | 18 mq | Euro:17,66 | | |
| | 12 | 648 | 2 | CASTELSANTANGELO SUL NERA | | | | | | Soppressa | |
| | 12 | 648 | 3 | CASTELSANTANGELO SUL NERA | | | | | | Soppressa | |
| | 12 | 648 | 4 | CASTELSANTANGELO SUL NERA VIA PIANA, 46 Piano T | | C/2 | 1 | 17 mq | Euro:14,05 | | |
| | 12 | 648 | 5 | CASTELSANTANGELO SUL NERA | | | | | | Soppressa | |
| | 12 | 648 | 6 | CASTELSANTANGELO SUL NERA VIA PIE DI NOCRIA, SC Piano T-1 - S1 | | A/3 | 1 | 6 vani | Euro:278,89 | | SI |
| | 12 | 648 | 7 | CASTELSANTANGELO SUL NERA VIA PIANA, SN Piano 1-2 | | A/2 | 2 | 7 vani | Euro:578,43 | | |

-

Foglio:**12** Particella:**648** Subalterno:**1**

Elenco Intestati

| | Nominativo o denominazione | Codice fiscale | Titolarità | Quota | Altri da |
|---|---|---|---|---|---|
| | MARINELLI MARCELLO nato a CASTELSANTANGELO SUL NERA (MC) il 12/06/1953 | MRNMCL53H12C267W | Proprieta' | 1/2 | |
| | MARINELLI MARZIO nato a CASTELSANTANGELO SUL NERA (MC) il 19/06/1957 | MRNMRZ57H19C267H | Proprieta' | 1/2 | |

Foglio:**12** Particella:**648** Subalterno:**4**

Elenco Intestati

| | Nominativo o denominazione | Codice fiscale | Titolarità | Quota | Altri da |
|---|---|---|---|---|---|
| | MARINELLI FRANCESCO nato a CASTELSANTANGELO SUL NERA (MC) il 04/05/1948 | MRNFNC48E04C267R | Proprieta' | 1000/1000 | |

Foglio:**12** Particella:**648** Subalterno:**6**

Elenco Intestati

| | Nominativo o denominazione | Codice fiscale | Titolarità | Quota | Altri dat |
|---|---|---|---|---|---|
| | RAFFA ROSA nata a VILLANOVA DEL BATTISTA (AV) il 27/02/1941 | RFFRSO41B67L973S | Proprieta' | 1/2 | |
| | SQUARCIA LUCIANO nato a NETTUNO (RM) il 19/07/1941 | SQRLCN41L19F880E | Proprieta' | 1/2 | |

## Foglio:**12** Particella:**648** Subalterno:**7 (PLAN. NON EVADIBILE)**

Elenco Intestati

| | Nominativo o denominazione | Codice fiscale | Titolarità | Quota | Altri dati |
|---|---|---|---|---|---|
| | BENFATTI IACOPO nato a ROMA (RM) il 13/11/1984 | BNFCPI84S13H501Y | Proprieta' | 1/1 | |

Foglio: **12** Particella: **652**
Immobili individuati: **1**

Elenco Immobili

| | Foglio | Particella | Sub | Indirizzo | Zona cens | Categoria | Classe | Consistenza | Rendita | Partita | Altri Dati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12 | 652 | | CASTELSANTANGELO SUL NERA VIA SARPONICCHIO, SNC Piano T-1 - 2 | | A/3 | 3 | 5 vani | Euro:322,79 | | |

-

## Foglio:**12** Particella:**652** fatto sopra

Elenco Intestati

| | Nominativo o denominazione | Codice fiscale | Titolarità | Quota | Altri dati |
|---|---|---|---|---|---|
| | MARINELLI ADRIANO nato a ROMA (RM) il 14/07/1954 | MRNDRN54L14H501A | Proprieta' | 1/2 | |
| | MARINELLI ORIETTA nata a ROMA (RM) il 23/09/1959 | MRNRTT59P63H501H | Proprieta' | 1/2 | |

Catasto: **Fabbricati**

Comune di: **CASTELSANTANGELO SUL NERA** Codice: **C267**
Foglio: **12** Particella: **1293**
Immobili individuati: **2**

Elenco Immobili

| | Foglio | Particella | Sub | Indirizzo | Zona cens | Categoria | Classe | Consistenza | Rendita | Partita | Altri Dati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12 | 1293 | 1 | CASTELSANTANGELO SUL NERA VIA SARPONICCHIO, SNC Piano T-1 - 2 | | | | | | Bene comune non censibile | |
| | 12 | 1293 | 2 | CASTELSANTANGELO SUL NERA VIA SARPONICCHIO, SNC Piano T-1 - 2 | | A/3 | 3 | 4 vani | Euro:258,23 | | |

-

## Foglio:**12** Particella:**1293** Subalterno:**2** fatto sopra

Elenco Intestati

| | Nominativo o denominazione | Codice fiscale | Titolarità | Quota | Altri dati |
|---|---|---|---|---|---|
| | MARINELLI ADRIANO nato a ROMA (RM) il 14/07/1954 | MRNDRN54L14H501A | Proprieta' | 1/2 | |
| | MARINELLI ORIETTA nata a ROMA (RM) il 23/09/1959 | MRNRTT59P63H501H | Proprieta' | 1/2 | |

Data: 23/10/2017 - n. T332020 - Richiedente: MRGPLA71P25E783L

Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Macerata

Dichiarazione protocollo n. 000023326 del 22/02/2002

Planimetria di u.i.u. in Comune di Castelsantangelo Sul Nera

Via Piana civ. 8

| Identificativi Catastali: | Compilata da: |
|---|---|
| Sezione: | Cappa Gianni |
| Foglio: 12 | Iscritto all'albo: |
| Particella: 646 | Geometri |
| Subalterno: 3 | Prov. Macerata N. 98 |

Scheda n. 1 Scala 1:200

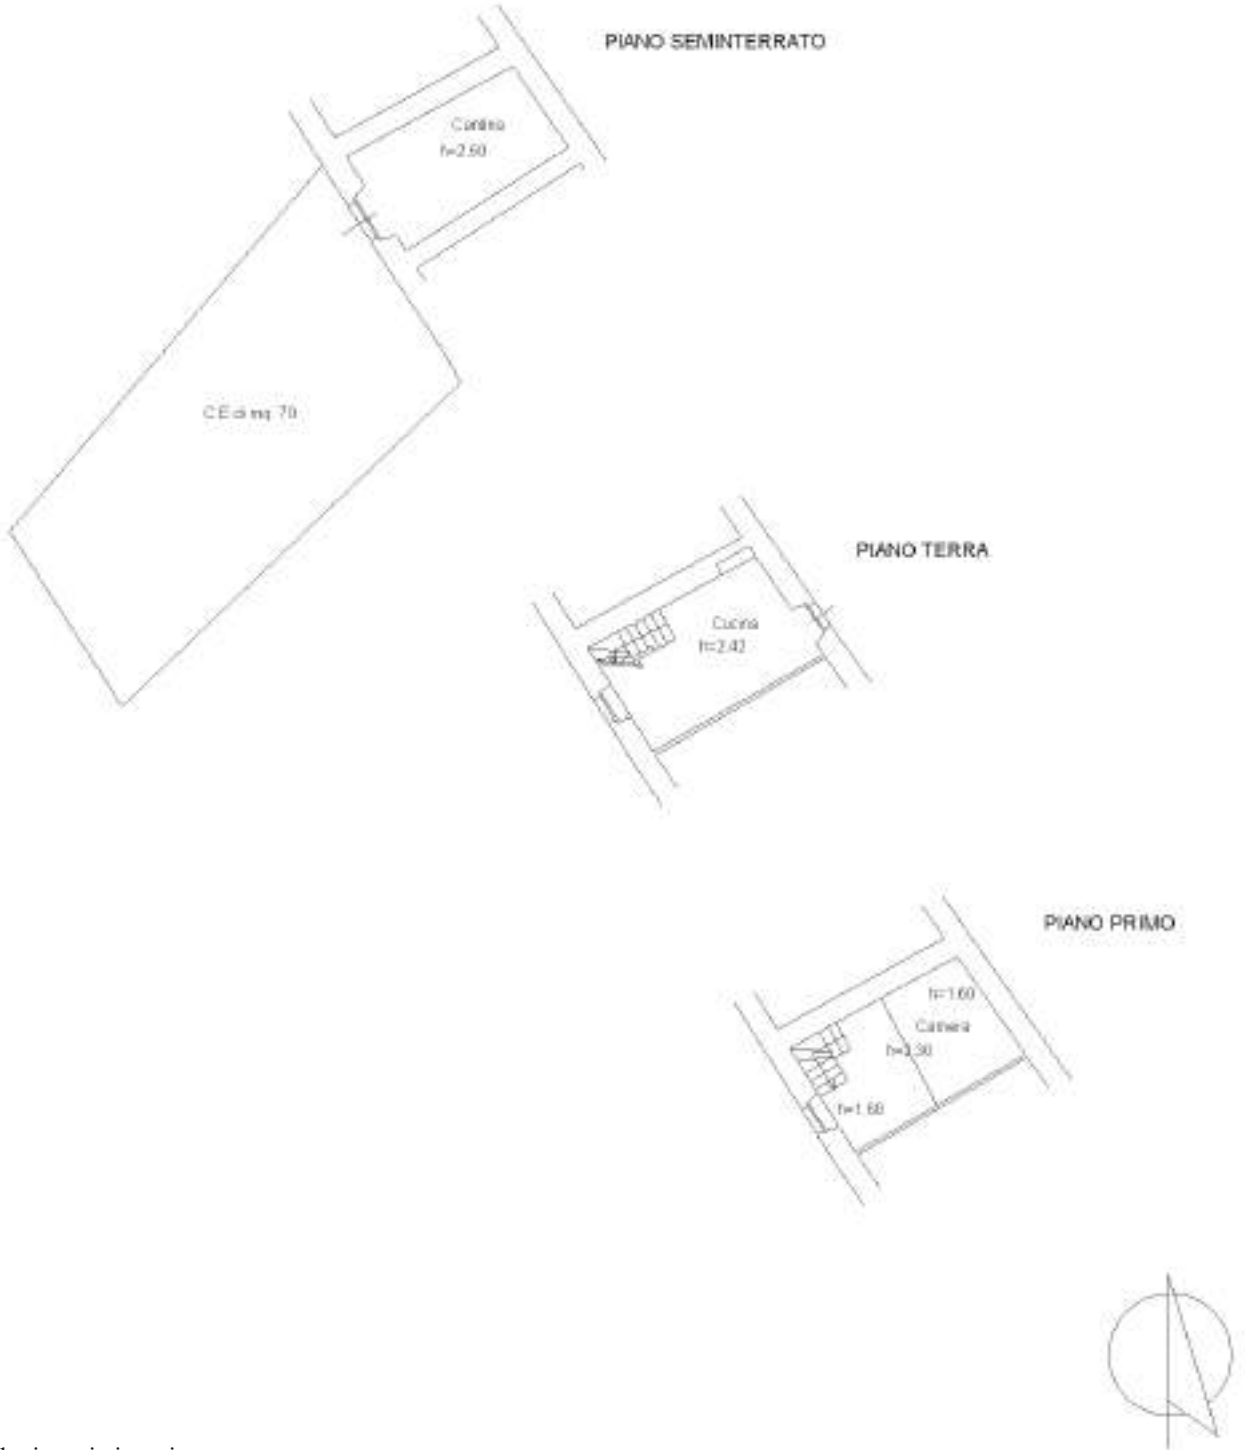


Catasto dei Fabbricati - Situazione al 23/10/2017 - Comune di CASTELSANTANGELO S NERA (C267) - < Foglio: 12 - Particella: 646 - Subalterno: 3 >
VIA PIANA SNC piano: T-1-S1;

Ultima planimetria in atti

Data: 23/10/2017 - n. T332020 - Richiedente: MRGPLA71P25E783L
Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa richiesto: A4(210x297)

Data: 23/10/2017 - n. T332064 - Richiedente: MRGPLA71P25E783L

Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Macerata

Dichiarazione protocollo n. 000023326 del 22/02/2002

Planimetria di u.i.u. in Comune di Castelsantangelo Sul Nera

Via Piana civ. 8

| Identificativi Catastali: | Compilata da: |
|---|---|
| Sezione: | Cappa Gianni |
| Foglio: 12 | Iscritto all'albo: |
| Particella: 646 | Geometri |
| Subalterno: 4 | Prov. Macerata N. 98 |

Scheda n. 1 Scala 1:200

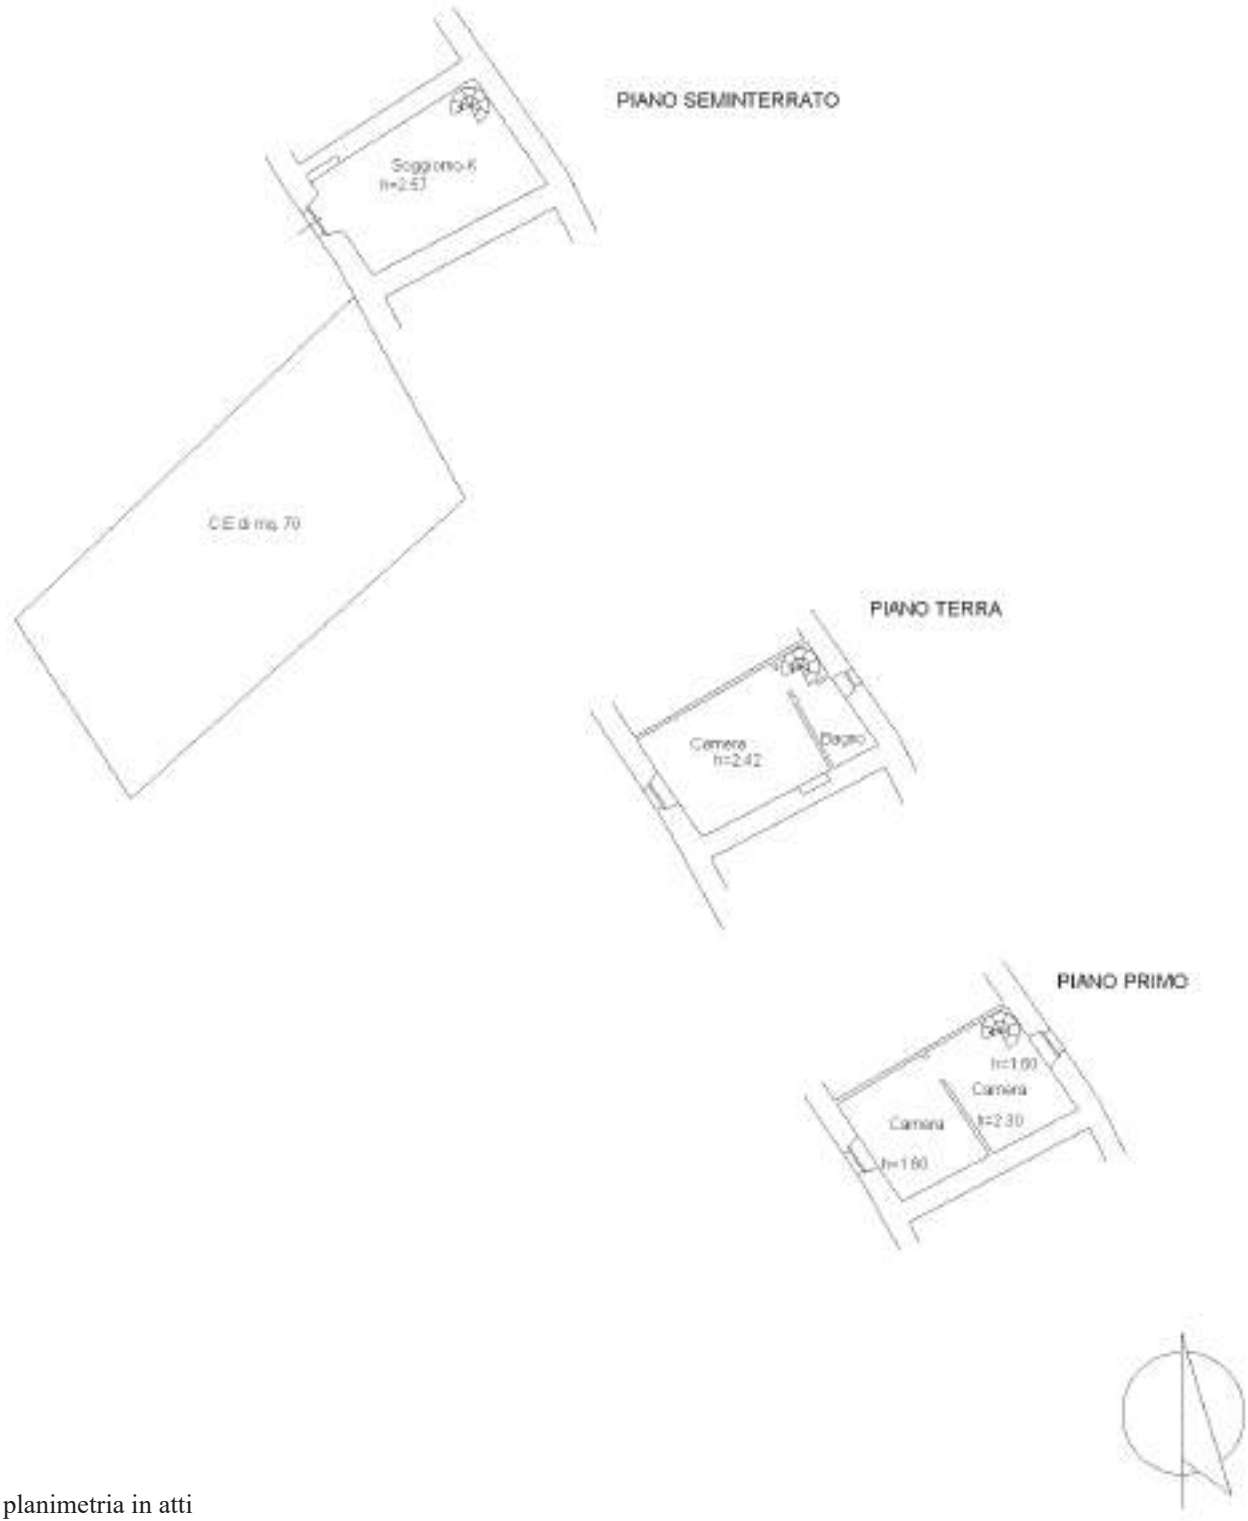


10 metri

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 23/10/2017 - Comune di CASTELSANTANGELO S NERA (C267) - < Foglio: 12 - Particella: 646 - Subalterno: 4 >
VIA PIANA SNC piano: T-1-S1;

Ultima planimetria in atti

Data: 23/10/2017 - n. T332064 - Richiedente: MRGPLA71P25E783L
Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa richiesto: A4(210x297)

Data: 23/10/2017 - n. T332145 - Richiedente: MRGPLA71P25E783L

Agenzia del Territorio
**CATASTO FABBRICATI**
Ufficio Provinciale di
Macerata

Dichiarazione protocollo n. 000023326 del 22/02/2002

Planimetria di u.i.u. in Comune di Castelsantangelo Sul Nera

Via Piana civ. 10

| Identificativi Catastali: | Compilata da: |
|---|---|
| Sezione: | Cappa Gianni |
| Foglio: 12 | Iscritto all'albo: |
| Particella: 646 | Geometri |
| Subalterno: 5 | Prov. Macerata N. 98 |

Scheda n. 1 Scala 1:200

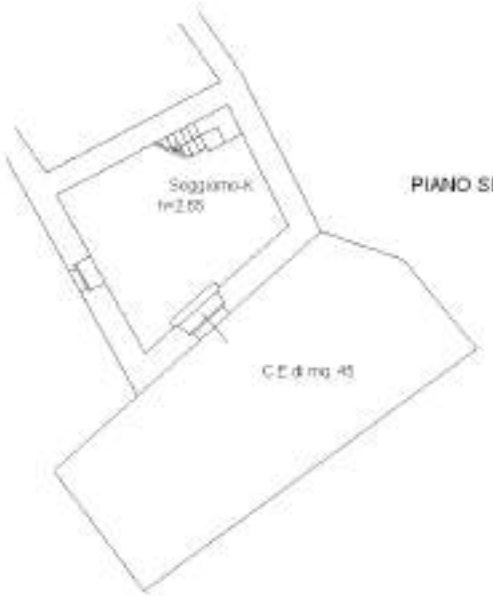


PIANO SEMINTERRATO

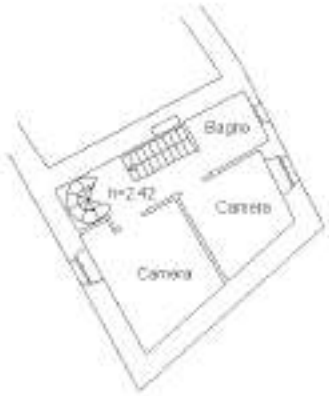


PIANO TERRA

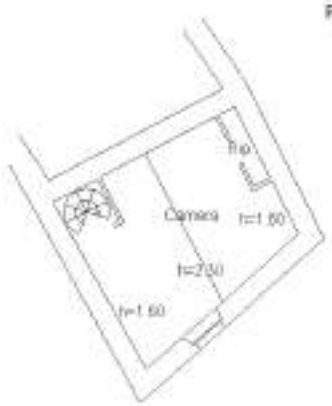


PIANO PRIMO

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 23/10/2017 - Comune di CASTELSANTANGELO S NERA (C267) - < Foglio: 12 - Particella: 646 - Subalterno: 5 >
VIA PIANA n. 10 piano: T-1-S1;

10 mem

Ultima planimetria in atti

Data: 23/10/2017 - n. T332145 - Richiedente: MRGPLA71P25E783L
Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa richiesto: A4(210x297)

Data presentazione:12/05/1998 - Data: 23/10/2017 - n. T332219 - Richiedente: MRGPLA71P25E783L

MODULARIO
F. rig. rand. 487

MINISTERO DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

# CATASTO EDILIZIO URBANO (RDL 13-4-1939, n. 652)

MOD. BN (CEU)

LIRE 500

Planimetria di u.i.u. in Comune di Castelsantangelo Sul Nera via Fraz. Noeria Via Piana civ. 1




P. T.
h = 2,30



P. 1ª
h = 2,68

Foglio 12 Scala 1:1000
Corte mq. 30

ORIENTAMENTO




SCALA DI 1:200

Dichiarazione di N.C. ☒
Denuncia di variazione ☐

Identificativi catastali
n. 651 sub.

Compilata dal Geom. Farroni Pier Paolo
(Titolo, cognome e nome)

iscritto all'albo dei Geometri
della provincia di Camerino n. 134
data 20-12-1997 Firma Fomani Pier Paolo

RISERVATO ALL'UFFICIO
~~2-8 GEN. 1998~~
~~A. 218/98~~

A. 1010/98

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 23/10/2017 - Comune di CASTELSANTANGELO S NERA (C267) - < Foglio: 12 - Particella: 651 - Subalterno: 3 >
VIA PIANA piano: T-1;
10 metri

Ultima planimetria in atti
Data presentazione:12/05/1998 - Data: 23/10/2017 - n. T332219 - Richiedente: MRGPLA71P25E783L
Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa richiesto: A4(210x297)

Data: 23/10/2017 - n. T332284 - Richiedente: MRGPLA71P25E783L

Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Macerata

Dichiarazione protocollo n. MC0182853 del 18/11/2008

Planimetria di u.i.u. in Comune di Castelsantangelo Sul Nera

Frazione Nocria civ. SNC

Identificativi Catastali:
Sezione:
Foglio: 12
Particella: 653
Subalterno:

Compilata da:
Farroni Cristiano

Iscritto all'albo:
Ingegneri

Prov. Macerata N. 1075

Scheda n. 1 Scala 1:200

PIANO PRIMO




PIANO TERRA

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 23/10/2017 - Comune di CASTELSANTANGELO S NERA (C267) - < Foglio: 12 - Particella: 653 - Subalterno: 0 >
VIA SARPONICCHIO SNC piano: T-1;

Ultima planimetria in atti

Data: 23/10/2017 - n. T332284 - Richiedente: MRGPLA71P25E783L
Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa richiesto: A4(210x297)

Data presentazione:17/02/1998 - Data: 23/10/2017 - n. T332285 - Richiedente: MRGPLA71P25E783L

MODULARIO
F. rig. rand. 497

MINISTERO DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

# CATASTO EDILIZIO URBANO (RDL 13-4-1939, n. 652)

MOD. BN (CEU)

LIRE 500

Planimetria di u.i.u. in Comune di Castelsantangelo Sol Nera via Fraz. Nocria Via Piana civ. //

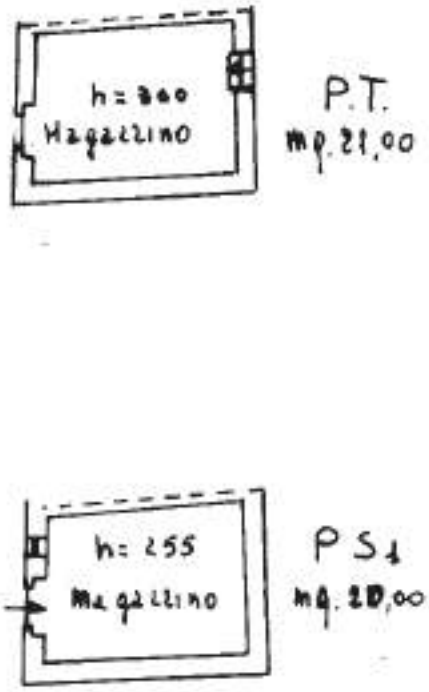





ORIENTAMENTO
Nord

SCALA DI 1:200

Dichiarazione di N.C. ☒
Denuncia di variazione ☐
Identificato per l'ufficio
T. 12
n. 654 sub.

Compilata dal Geom. Farroni Pier Paolo
(Titolo, cognome e nome)
Iscritto all'Ufficio del Geometri
della provincia di Camerino n. 154
data 20-11-97 Firma [signature]

RISERVATO ALL'UFFICIO

10 metri

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 23/10/2017 - Comune di CASTELSANTANGELO S NERA (C267) - < Foglio: 12 - Particella: 654 - Subalterno: 0 >
VIA PIANA piano: T-S1;

Ultima planimetria in atti
Data presentazione:17/02/1998 - Data: 23/10/2017 - n. T332285 - Richiedente: MRGPLA71P25E783L
Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa richiesto: A4(210x297)

Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Macerata

Dichiarazione protocollo n. MC0182851 del 18/11/2008

Planimetria di u.i.u. in Comune di Castelsantangelo Sul Nera

Frazione Nocria civ. SNC

Identificativi Catastali:
Sezione:
Foglio: 12
Particella: 652
Subalterno:

Compilata da:
Farroni Cristiano

Iscritto all'albo:
Ingegneri

Prov. Macerata N. 1075

Scheda n. 1 Scala 1:200

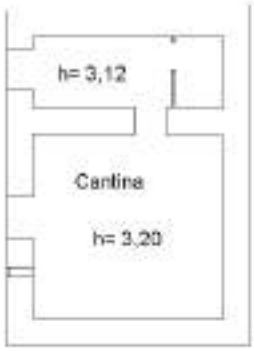


PIANO TERRA

PIANO PRIMO

PIANO SECONDO

10 mm

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 23/10/2017 - Comune di CASTELSANTANGELO S NERA (C267) - < Foglio: 12 - Particella: 652 - Subalterno: 0 >
VIA SARPONICCHIO SNC piano: T-1-2;

Ultima planimetria in atti

Data: 23/10/2017 - n. T332288 - Richiedente: MRGPLA71P25E783L

Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Macerata

Dichiarazione protocollo n. MC0182858 del 18/11/2008

Planimetria di u.i.u. in Comune di Castelsantangelo Sul Nera

Frazione Nocria civ. SNC

Identificativi Catastali:
Sezione:
Foglio: 12
Particella: 1293
Subalterno:

Compilata da:
Farroni Cristiano

Iscritto all'albo:
Ingegneri

Prov. Macerata N. 1075

Scheda n. 1 Scala 1:200

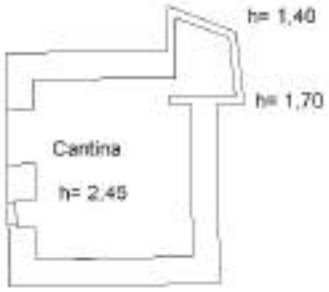


PIANO TERRA

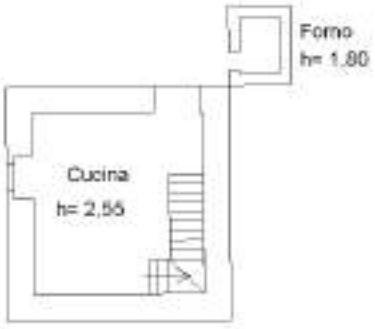


PIANO PRIMO

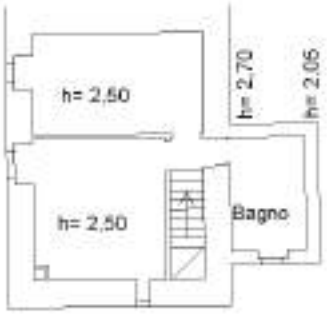


PIANO SECONDO

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 23/10/2017 - Comune di CASTELSANTANGELO S NERA (C267) - < Foglio: 12 - Particella: 1293 - Subalterno: 2 >
VIA SARPONICCHIO SNC piano: T-1-2;

Ultima planimetria in atti

Data: 23/10/2017 - n. T332288 - Richiedente: MRGPLA71P25E783L
Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa richiesto: A4(210x297)

Data presentazione:08/06/2000 - Data: 23/10/2017 - n. T332357 - Richiedente: MRGPLA71P25E783L

MINISTERO DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

# CATASTO EDILIZIO URBANO (RDL 13-4-1939, n. 652)

MOD. BN (CF11)

200

Planimetria di u.i.u. in Comune di CASTELSANTANGELO SUL NERA via FRAZNE NOCRIA civ.

PIANO TERRA

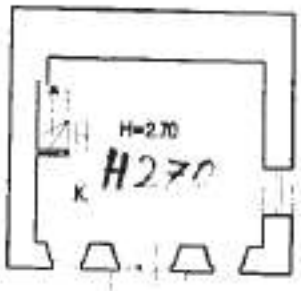


PIANO S1°

TOGLIE 12
PARTICELLA 622
SCALA 1:2000

EX PARTICELLA 622

ORIENTAMENTO

SCALA DI 1: 200

Dichiarazione di N.C. ☐
Denuncia di variazione ☒

Compilata dal GEOM.
(Titolo, cognome e nome)
GATTI ANTONIO

Iscritto all'albo de i GEOMETRI

Firma

RISERVATO ALL'UFFICIO

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 23/10/2017 - Comune di CASTELSANTANGELO S NERA (C267) - < Foglio: 12 - Particella: 677 - Subalterno: 0 >
VIA PIE DI NOCRIA SNC piano: T-1;

10 metri

Ultima planimetria in atti

Data presentazione:08/06/2000 - Data: 23/10/2017 - n. T332357 - Richiedente: MRGPLA71P25E783L
Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa richiesto: A4(210x297)

Agenzia del Territorio
**CATASTO FABBRICATI**
Ufficio Provinciale di
Macerata

Dichiarazione protocollo n. MC0012519 del 28/01/2010

Planimetria di u.i.u. in Comune di Castelsantangelo Sul Nera

Via Piè Di Nocria civ. SC

Identificativi Catastali:
Sezione:
Foglio: 12
Particella: 647
Subalterno: 4

Compilata da:
Squarcia Marina

Iscritto all'albo:
Architetti

Prov. Roma N. 16353

Scheda n. 1 Scala 1:200

ABITAZIONE
Piano Terra
H= m. 2,70

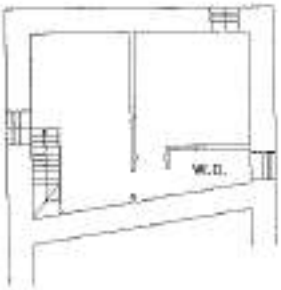


Primo Piano
H media = m. 2,60

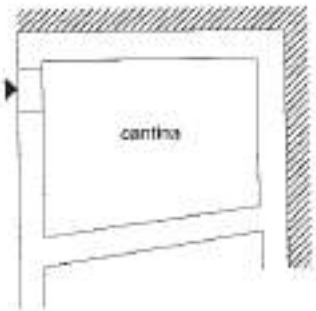


Piano Cantina
H = m. 2,70

ORIENTAMENTO

Scala 1:200

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 23/10/2017 - Comune di CASTELSANTANGELO S NERA (C267) - < Foglio: 12 - Particella: 647 - Subalterno: 4 >
VIA PIE DI NOCRIA n. SC piano: T-1-S1;

10 mem

Ultima planimetria in atti

Data: 23/10/2017 - n. T332543 - Richiedente: MRGPLA71P25E783L

Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Macerata

Dichiarazione protocollo n. MC0042790 del 05/03/2009

Planimetria di u.i.u. in Comune di Castelsantangelo Sul Nera

Fraz. Nocria civ. SNC

Identificativi Catastali:
Sezione:
Foglio: 21
Particella: 648
Subalterno: 1

Compilata da:
Cirilli Ernesto

Iscritto all'albo:
Geometri

Prov. Macerata N. 958

Scheda n. 1 Scala 1:200

PIANO S1

Ultima planimetria in atti

Data: 23/10/2017 - n. T332543 - Richiedente: MRGPLA71P25E783L
Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa richiesto: A4(210x297)

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 23/10/2017 - Comune di CASTELSANTANGELO S NERA (C267) - < Foglio: 12 - Particella: 648 - Subalterno: 1 >
VIA SARPONICCHIO SNC piano: S1;

Data: 23/10/2017 - n. T332616 - Richiedente: MRGPLA71P25E783L

Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Macerata

Dichiarazione protocollo n. MC0279964 del 05/12/2007

Planimetria di u.i.u. in Comune di Castelsantangelo Sul Nera

Via Piana civ. 46

Identificativi Catastali:
Sezione:
Foglio: 12
Particella: 648
Subalterno: 4

Compilata da:
Farroni Cristiano

Iscritto all'albo:
Ingegneri

Prov. Macerata N. 1075

Scheda n. 1 Scala 1:200

PIANO TERRA

10 mm

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 23/10/2017 - Comune di CASTELSANTANGELO S NERA (C267) - < Foglio: 12 - Particella: 648 - Subalterno: 4 >
VIA PIANA n. 46 piano: T;

Ultima planimetria in atti

Data: 23/10/2017 - n. T332616 - Richiedente: MRGPLA71P25E783L
Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa richiesto: A4(210x297)

Agenzia del Territorio
**CATASTO FABBRICATI**
Ufficio Provinciale di
Macerata

Dichiarazione protocollo n. MC0012519 del 28/01/2010

Planimetria di u.i.u. in Comune di Castelsantangelo Sul Nera

Via Piè Di Nocria civ. SC

Identificativi Catastali:
Sezione:
Foglio: 12
Particella: 647
Subalterno: 4

Compilata da:
Squarcia Marina

Iscritto all'albo:
Architetti

Prov. Roma N. 16353

Scheda n. 1 Scala 1:200

ABITAZIONE
Piano Terra
H= m. 2,70

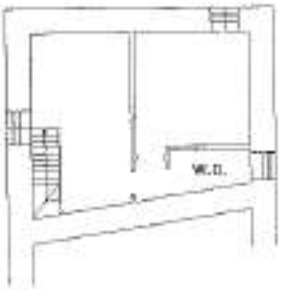


Primo Piano
H media = m. 2,60

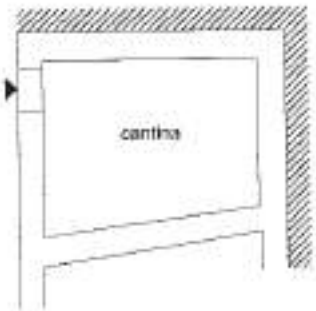


Piano Cantina
H = m. 2,70

ORIENTAMENTO

Scala 1:200

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 23/10/2017 - Comune di CASTELSANTANGELO S NERA (C267) - < Foglio: 12 - Particella: 648 - Subalterno: 6 >
VIA PIE DI NOCRIA n. SC piano: T-1-S1;

Ultima planimetria in atti
